



No. 297/CPQ100/2023-S0

Perihal : Hasil Verifikasi Capaian TKDN EPC GPF JTB, Monitoring ke-61

(Periode Mei 2023)

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Yang terhormat, **Direktur**RJJ Consortium for JTB Project

C/O PT Rekayasa Industri

Jl. Kalibata Timur I No.36, Jakarta 12740

### Dengan hormat,

Mengacu Kontrak No. 4650000076, Pekerjaan Gas Development Project for The Unitization of The Jambaran-Tiung Biru Field (JTB Unitization Gas Project) dengan komitmen TKDN sebesar 40,03%.

Berdasarkan hasil Laporan Monitoring Verifikasi TKDN ke-61 oleh Surveyor Independen, PT. Sucofindo untuk periode verifikasi Oktober 2017 sampai dengan Mei 2023 didapatkan progress capaian TKDN terverifikasi sebesar 43,11% terhadap progress biaya terverifikasi sebesar 100,93% dimana sudah termasuk sebagian biaya Contract Change Order (CCO), tetapi belum termasuk outstanding items yang masih dalam proses verifikasi. Sedangkan progress biaya dari dokumen invoice yang sudah diterima oleh surveyor independen PT. Sucofindo adalah sebesar 112,06% terhadap total biaya dalam kontrak awal. Bersama ini PEPC meminta RJJ agar segera menyiapkan form komitmen TKDN SC-19B untuk Contract Change Order (CCO) secepatnya.

Mencermati nilai perolehan capaian TKDN terverifikasi sebesar 43,11% sampai dengan bulan Mei 2023 yang mana sudah termasuk sebagian biaya CCO, kami menegaskan kembali halhal sebagai berikut:

- 1. Menerapkan secara konsisten target capaian TKDN sesuai Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 2. Bilamana setelah pelaksanaan kontrak, pencapaian prosentase dan nilai komitmen TKDN tidak terpenuhi, maka sanksi administrasi dan finansial akan diberlakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak serta peraturan yang berlaku.





- 2 -

No.297/CPQ100/2023-S0

Terlampir Laporan Monitoring Verifikasi Capaian TKDN ke-61 sebagai bahan evaluasi Saudara untuk meningkatkan kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri sesuai target yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

General Manager Gas Project JTB



Tembusan:

1. Direktur Utama

PEPC 2046

- 2. Direktur Utama PT Rekayasa Industri
- 3. VP Business Support

PEPC 2046

4. Chief Audit Executive

**PEPC 2046** 

5. Project Manager RJJ Consortium for JTB Project



FIGURE 1



### **MONITORING KE 61**

LAPORAN VERIFIKASI CAPAIAN TKDN EPC GPF JTB

**DENGAN KONTRAKTOR:** 

KONSORSIUM PT. REKAYASA INDUSTRI,
JGC CORPORATION & PT. JGC INDONESIA

KONTRAK NO. 3900002470

GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN - TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)





### LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN

### JASA MONITORING DAN VERIFIKASI CAPAIAN TKDN EPC GPF JTB

KONTRAK NO. 3900002470

NAMA KONTRAK : GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF

THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION

**GAS PROJECT)** 

NO. KONTRAK : 4650000076

PERIODE: MEI 2023 (MONITORING #61)

REVISI : 00

PENYEDIA : KONSORSIUM PT. REKAYASA INDUSTRI - JGC

BARANG/JASA CORPORATION - PT. JGC INDONESIA

PENGGUNA : PT. PERTAMINA EP CEPU

**BARANG/JASA** 

PT. SUC	OFINDO	PT. PERTAMINA EP CEPU
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
		*
Andreas Setiadi (Senior Assessor)	Imam Agung Prasetyo (Project Manager)	<ul><li>Gunanto</li><li>(Manager Supply Chain Management</li><li>Zona 12)</li></ul>
Tanggal: 31-07-2023	Tanggal: 31-07-2023	Tanggal:





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00 Periode Data: 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023

### **DAFTAR ISI**

I.	REFERENSI	2
II.	TUJUAN	2
III.	RUANG LINGKUP	2
IV.	BATASAN	3
V.	RINGKASAN EKSEKUTIF	4
VI.	PEMBAHASAN	4
6.1	Kemajuan Verifikasi Capaian TKDN Terhadap Total Biaya Kontrak	4
6.2	Analisa Tingkat Komponen Dalam Negeri	5
VII.	SASARAN PERHATIAN	9
VIII.	OUTSTANDING ITEM	9
IX.	RENCANA AKTIVITAS PERIODE SELANJUTNYA	18
Χ.	LAMPIRAN	18





### NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00 Periode Data: 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023

#### I. REFERENSI

- Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang "Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)".
- Pedoman Tata Kerja No. 007 PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KKKS.
- Perjanjian Nomor 3900002470 antara PT. Pertamina EP Cepu dan PT. SUCOFINDO (SCI) tentang Jasa Monitoring dan Verifikasi Capaian TKDN EPC GPF JTB.
- Kontrak No. 4650000076, antara PT. Pertamina EP Cepu dengan Konsorsium PT. Rekayasa Industri JGC Corporation PT. JGC Indonesia (RJJ) untuk pekerjaan "Gas Development Project for the Unitization of the Jambaran-Tiung Biru Field (JTB Unitization Gas Project)".
- Panduan Monitoring dan Verifikasi Capaian TKDN EPC GPF JTB.
- Buku APDN (Apresiasi Produksi Dalam Negeri) Kementerian ESDM.
- Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian.

#### II. TUJUAN

Melakukan Verifikasi Capaian TKDN secara periodik, baik pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan (monitoring) atau telah berakhir (*post audit*).

#### III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi:

- Monitoring dan verifikasi TKDN gabungan Barang dan Jasa pada proyek "Gas Development Project for the Unitization of the Jambaran-Tiung Biru Field (JTB Unitization Gas Project)" dengan pemilik pekerjaan PT. Pertamina EP Cepu dengan pelaksana pekerjaan Konsorsium PT. Rekayasa Industri - JGC Corporation
   PT. JGC Indonesia.
- *Review* atas Daftar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa yang diajukan oleh Kontraktor EPC untuk 3 (tiga) bulan ke depan terhadap buku APDN, Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, dan *Approved Manufacturer List* (*AML*) PT. Pertamina EP Cepu.





### NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00 Periode Data: 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023

#### IV. BATASAN

- a. Verifikasi TKDN terhadap Kontraktor EPC dilakukan berdasarkan ketentuan perhitungan TKDN yang terdapat dalam kontrak yang berlaku antara Perusahaan dan Kontraktor EPC, yaitu:
  - Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013
  - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011
  - SK DIRJEN MIGAS Nomor 181.K/10/DJM.S/2014
  - Pedoman Tata Kerja Nomor 007/SKKO0000/2015/S0
- b. Verifikasi TKDN yang dilakukan oleh Surveyor Independen berdasarkan data-data dan dokumen pendukung yang diserahkan oleh Kontraktor EPC sesuai batas waktu penyerahan yang telah disepakati pada saat opening meeting.
- c. Jika Kontraktor EPC memberikan dokumen pendukung berupa PO/WO/SPK, maka komponen biaya tidak dimasukkan dalam perhitungan TKDN. PO/WO/SPK dimasukkan dalam dokumen tertunda, komponen biaya yang tertulis dalam dokumen tersebut akan dimasukkan dalam perhitungan TKDN bilamana bukti pengeluaran telah diterima.
- d. Surveyor independen tidak melakukan verifikasi untuk realisasi pembayaran yang terjadi.
- e. Surveyor independen tidak melakukan penilaian kewajaran terhadap jumlah (kuantitas barang dan durasi kerja) dan nilai. Pemeriksaan terhadap jumlah dan nilai didasarkan pada dokumen pendukung yang diserahkan oleh penyedia barang dan/atau jasa.
- f. Surveyor independen tidak melakukan penelahaan terhadap kewajaran dan keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Kontraktor EPC dan Subkontraktor. Kontraktor EPC dan Subkontraktor bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan kepada surveyor independen.
- g. Dalam perhitungan TKDN, pemakaian kurs mata uang mengacu pada kurs mata uang yang diterbitkan oleh instansi pemerintah (Kementerian Keuangan c.g. Dirjen Pajak).
- h. Panduan ini hanya berlaku untuk pekerjaan Jasa Verifikasi dan Monitoring TKDN pada setiap EPC untuk Proyek "Gas Development Project for Unitization of The Jambaran Tiung Biru Field (JTB Unitization Gas Project)".
- Keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung menjadi tanggung jawab kontraktor EPC.





### NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

Periode Data: 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023

#### V. RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Bulanan ini merupakan ringkasan hasil verifikasi dan monitoring TKDN kegiatan EPC GPF JTB berdasarkan *Self-Assessment (SA)* yang telah diberikan oleh RJJ dengan periode data 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023.

Tabel 1. Perbandingan Capaian TKDN komitmen dengan TKDN akumulatif pada saat verifikasi

No	Komponen Biaya	TKDN Komitmen (%)		TKDN Kur s.d. Mei (%)	TKDN Proyeksi s.d. Mei 2023	
		Individual	Overall*	Self- Assessment*	Verifikasi*	(%)
A	Barang	32,08	17,85	8,33	6,94	
В	Jasa	50,00	22,18	41,35	36,17	
	TOTAL		40,03	49,68	43,11	47,31

#### Keterangan:

- \* = nilai pembagi terhadap total biaya kontrak
- TKDN hasil verifikasi kumulatif sebesar 43,11% adalah hasil verifikasi kumulatif terhadap total biaya yang sudah terverifikasi sebesar 100,93% (lihat Grafik 1)
- TKDN Proyeksi sebesar 47,31% adalah penjumlahan antara TKDN hasil verifikasi 43,11% dan TKDN Estimasi 4,20% (Tabel 9) atas pekerjaan yang belum terverifikasi s.d. Mei 2023
- TKDN hasil verifikasi aktual sebesar 87,60% pada Grafik 1 adalah hasil verifikasi untuk bulan Mei 2023

### VI. PEMBAHASAN

### 6.1 Kemajuan Verifikasi Capaian TKDN Terhadap Total Biaya Kontrak

Kemajuan Verifikasi Capaian TKDN berdasarkan data yang dikumpulkan dari 23 Maret 2018 – 31 Maret 2023:

Tabel 2. Kemajuan Verifikasi Capaian TKDN

No	Komponen Biaya	TKDN Kumulatif s.d. April 2023 (%)		TKDN Periode Mei 2023 (%)		TKDN Kumulatif s.d. Mei 2023 (%)	
		Self- Assessment	Verifikasi	Self- Assessment	Verifikasi	Self- Assessment	Verifikasi
A	Barang	8,33	6,94	0,006	0,001	8,33	6,94
В	Jasa	41,29	36,12	0,05	0,05	41,35	36,17
	TOTAL	49,62	43,06	0,06	0,05	49,68	43,11





### NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00 Periode Data: 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023

### 6.2 Analisa Tingkat Komponen Dalam Negeri

### **6.2.1 Barang**

Komponen biaya yang termasuk kedalam kategori barang dalam perhitungan TKDN adalah material terpakai dan peralatan terpasang.

### 1. Material Terpakai

Kontribusi komponen dalam negeri untuk material terpakai adalah sebesar 0,001% dengan perincian TKDN sebagai berikut:

Tabel 3. Komponen Dalam Negeri Material Terpakai

No.	Deskripsi	Vendor/ Subkontraktor	Kontribusi Biaya (%)	TKDN SA (%)	TKDN Verifikasi (%)	Status Barang APDN	Keterangan
1.	Ready Mix Concrete	PT Standar Beton Indonesia	0,001	78,00	95,95	Barang Non APDN	Hasil Verifikasi
2.	Chemical & Sulfuric Acid	PT Langgeng Lestari Jaya	0,002	0,00	0,00	Barang Non APDN	Produk Impor
3.	Gas Bumi	PT Pertagas Niaga	0,01	80,00	0,00	Barang Non APDN	Dalam Proses Verifikasi

### 2. Peralatan Terpasang

Kontribusi komponen dalam negeri untuk peralatan terpasang adalah sebesar 0,00% dengan perincian TKDN sebagai berikut.

Tabel 4. Komponen Dalam Negeri Peralatan Terpasang

No.	Deskripsi	Vendor/ Subkontraktor	Kontribusi Biaya (%)	TKDN SA (%)	TKDN Verifikasi (%)	Status Barang APDN	Keterangan
1.	-	-	-	-	-		-





### NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00 Periode Data: 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023

#### 6.2.2 Jasa

Komponen biaya yang termasuk kedalam kategori jasa dalam perhitungan TKDN adalah tenaga kerja & konsultan, alat kerja / fasilitas kerja, konstruksi / fabrikasi, dan jasa umum.

### 1. Tenaga Kerja & Konsultan

Kontribusi komponen dalam negeri untuk tenaga kerja & konsultan adalah sebesar 0,04% dengan perincian TKDN sebagai berikut:

Tabel 5. Komponen Dalam Negeri Tenaga Kerja & Konsultan

No.	Deskripsi	Vendor/ Subkontraktor	Kontribusi Biaya (%)	TKDN SA (%)	TKDN Verifikasi (%)	Keterangan
1.	EPC Project Staff	PT Rekayasa Industri, PT JGC Indonesia	0,04	100,00	100,00	WNI

### 2. Alat Kerja/Fasilitas Kerja

Kontribusi komponen dalam negeri untuk alat kerja / fasilitas kerja adalah sebesar 0,00% dengan perincian TKDN sebagai berikut:

Tabel 6. Komponen Dalam Negeri Alat kerja / Fasilitas Kerja

No.	Deskripsi	Vendor/ Subkontraktor	Kontribusi Biaya (%)	TKDN SA (%)	TKDN Verifikasi (%)	Keterangan
1.	-	-	-	-	-	-

### 3. Konstruksi / Fabrikasi

Kontribusi komponen dalam negeri konstruksi / fabrikasi sebesar 0,00% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7. Komponen Dalam Negeri Konstruksi / Fabrikasi

No.	Deskripsi	Vendor/ Subkontraktor	Kontribusi Biaya (%)	TKDN SA (%)	TKDN Verifikasi (%)	Keterangan
1.	-	-	-	-	-	-





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00 Periode Data: 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023

### 4. Jasa Umum

Kontribusi komponen dalam negeri jasa umum sebesar 0,008% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 8. Komponen Dalam Negeri Jasa Umum

No.	Deskripsi	Vendor/ Subkontraktor	Kontribusi Biaya (%)	TKDN SA (%)	TKDN Verifikasi (%)	Keterangan
1.	Allowance	PT Rekayasa Cakrawala Resources	0,001	100,00	100,00	1
2.	Catering	PT Sinar Juwita Kurama	0,002	100,00	100,00	-
3.	Driver	Koperasi Reka Sejahtera	0,0005	100,00	100,00	-
4.	Environmentally Observe Service	LPPM Undip	0,003	100,00	100,00	
5.	General Job Clean Up	PT The Service Line	0,0002	100,00	100,00	ı
6.	Sewa Mesin Fotokopi	Koperasi Reka Sejahtera	0,0006	100,00	100,00	-
7.	Telekomunikasi & Internet	Telkomsel	0,0001	100,00	100,00	-





#### LAPORAN BULANAN

#### JASA MONITORING DAN VERIFIKASI CAPAIAN TKDN EPC GPF JTB


### NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

Periode Data: 23 Maret 2018 - 31 Mei 2023

#### 6.2.3 Grafik Kurva-S

Grafik 1. Grafik Kurva-S Tingkat Komponen Dalam Negeri Konsorsium PT. Rekayasa Industri - JGC Corporation - PT. JGC Indonesia (RJJ)

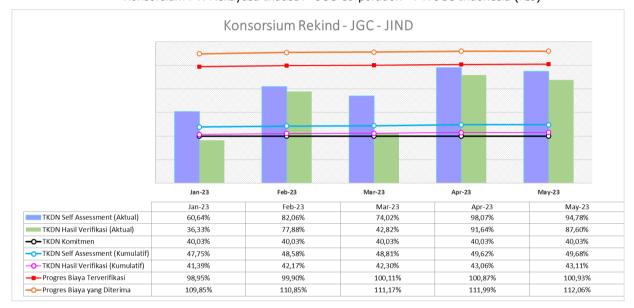

#### Keterangan:

Terverifikasi

Diterima

- TKDN Komitmen : TKDN Perencanaan RJJ

- TKDN *Self Assessment* : TKDN hasil penilaian sendiri oleh RJJ kumulatif terhadap total biaya kontrak sampai

(Kumulatif) dengan periode tersebutTKDN Hasil Verifikasi : TKDN hasil verifikasi SCI kumulatif terhadap total biaya kontrak sampai dengan

(Kumulatif) periode tersebut
 TKDN Self Assessment : TKDN hasil penilaian sendiri oleh RJJ terhadap total biaya aktual pada bulan yang

(Aktual) bersangkutan
 TKDN Hasil Verifikasi : TKDN hasil verifikasi SCI terhadap total biaya aktual pada bulan yang bersangkutan

(Aktual)
- Progres Biaya : Biaya yang sudah terverifikasi terhadap total biaya kontrak sampai dengan periode

- Progres Biaya yang : Total biaya yang sudah diterima terhadap total biaya kontrak sampai dengan periode

tersebut

tersebut





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00 Periode Data: 23 Maret 2018 – 31 Mei 2023

### **VII. SASARAN PERHATIAN**

- Terdapat perubahan nilai kontrak pada amandemen kontrak ke-1, dari USD 983.826.145,00 menjadi USD 983.825.000,00.

### **VIII. OUTSTANDING ITEM**

Tabel 9. Daftar Subkontraktor/Vendor yang Masih Dalam Proses Verifikasi

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI INVOICE (%)	
BARANG							
1.	Membrane Permeate Incinerator Package	PT Sahabat Nusantara Teknologi Inovasi	-	PT Rekayasa Industri	5,00	0,67	
2.	Temporary Gantry Crane	PT Tridasa Prawira	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,02	
3.	Overhead Crane and Jib Crane	PT Tridasa Prawira	-	PT JGC Indonesia	50,00	0,01	
4.	Bleed Water Treatment Package	PT Energy Management Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	5,00	1,11	
5.	Chemical Injection Package	PT Zoneta Prima Abadi	-	PT Rekayasa Industri	5,00	0,13	
6.	Electric Heaters	PT Zoneta Prima Abadi	-	PT Rekayasa Industri	10,00	0,03	
7.	Injection Quill	PT Korosi Specindo	-	PT Rekayasa Industri	25,00	0,007	
8.	Liquid (Diesel) Custody Metering	PT Control Systems Arena Para Nusa	-	PT Rekayasa Industri	10,00	0,02	
9.	Air Cooled HE (Package 3) Local Portion	PT Daekyung Indah Heavy Industry	-	PT Rekayasa Industri	20,00	0,075	
10.	Nitrogen Generator System	PT Parker Hannifin Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	5,00	0,13	
11.	Sample Connection	PT Korosi Specindo	-	PT Rekayasa Industri	5,00	0,05	
12.	Water Treatment & Fire Water Package	PT Suhada Petroleum	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,02	





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI <i>INVOICE</i> (%)
13.	Distribution Panel	PT Navitas Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,04
14.	Fire Extinguisher	PT Maste Dayaa	-	PT Rekayasa Industri	15,00	0,055
15.	Furniture Custom	PT Vivere Multi Kreasi	-	PT JGC Indonesia	50,00	0,04
16.	Silencer	PT Fajar Benua Indopack	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,004
17.	Furniture	PT Vinotindo Grahasarana	-	PT JGC Indonesia	60,00	0,008
18.	Furniture Custom Decorous	PT Dinamika Sistem Modular	-	PT JGC Indonesia	50,00	0,046
19.	Pipe and Fitting	PT Sinar Paku Alam	-	PT JGC Indonesia	50,00	0,004
20.	Temporary Electricity Utility	PT Bambang Djaja	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,04
21.	Sprinkler and Deluge Valve	PT Maste Dayaa	-	PT Rekayasa Industri	20,00	0,02
22.	GRC Decorative Wall	PT Hexacon Utama	-	PT JGC Indonesia	90,00	0,003
23.	Liquid Analyzer	PT ABB Sakti Industri	-	PT Rekayasa Industri	5,00	0,01
24.	Electrical Heat Tracing	PT Zoneta Prima Abadi	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,015
25.	Civil Material for Tie In	PT Empat Empat Santoso	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,05
26.	Hot Induction Bend Clad	PT Proclad Asia International	-	PT Rekayasa Industri	10,00	0,01
27.	Bulk Material (Junction Box & Loc Control Station)	PT Promindo Makmur Abadi	-	PT Rekayasa Industri	5,00	0,007
28.	Davit Lowering Flare Tip System	PT Sahabat Nusantara Teknologi Inovasi	-	PT Rekayasa Industri	5,00	0,002
29.	Steel Material (Pembuatan	CV Samudra Agung	-	PT JGC Indonesia	40,00	0,002





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI <i>INVOICE</i> (%)
	Bicycle Rack dan Guard Post)					
30.	HVAC Panel	PT Navitas Indonesia	-	PT JGC Indonesia	40,00	0,02
31.	Panel STP	PT Utama Fibreglass Raya	-	PT JGC Indonesia	40,00	0,002
32.	Dedusting Solid Storage	PT Asia Permai Cemerlang	-	PT Rekayasa Industri	15,00	0,04
33.	Raised Floor	PT Omega Padma Indonesia	-	PT JGC Indonesia	20,00	0,001
34.	Sample Bomb	PT Korosi Specindo	-	PT Rekayasa Industri	5,00	0,001
35.	Water Injection Pump	PT Panca Nekasa	-	PT Rekayasa Industri	10,00	0,02
36.	Partition Wall	CV Citra Wardhana	-	PT JGC Indonesia	30,00	0,006
37.	Ceiling, Mezanine, Partition Wall	CV Citra Wardhana	-	PT JGC Indonesia	30,00	0,001
38.	Shelter Fire and Cabinet Support	PT Cahya Mandiri Gemilang	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,001
39.	JB Gas Bumi Commissioning CT310	PT Pertagas Niaga	-	PT Rekayasa Industri	40,00	0,44
JASA	1					
1.	General Civil Work	CV Sinergy Bangun Sarana	-	PT Rekayasa Industri	85,00	0,007
2.	Batching Plant	PT Standar Beton Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,01
3.	Temporary Facility Work Package 2	PT Sido Mulyo Bayu Aji	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,04
4.	Temporary Facility Package 8	PT Puspetindo	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,06
5.	Temporary Water Supply Pipeline	PT Putra Kepatihan Abadi	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,03
6.	Process Safety Study	PT ERM Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	75,00	0,07
7.	TF CCTV PAGA System	CV Abadi Nusantara Teknik	-	PT Rekayasa Industri	25,00	0,001





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI <i>INVOICE</i> (%)
8.	Supply and Install FRP Bridge	PT Setu Kanaka	-	PT Rekayasa Industri	75,00	0,04
9.	Package 1 Under Ground Work	PT Yasa Industri Nusantara	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,20
10.	Sheet Pile	PT Terapan Nilai Osilasi Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	75,00	0,04
11.	Steel Structure Package 1	PT Yasa Industri Nusantara (Konsorsium PT Gunung Baja Konstruksi)	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,84
12.	Crossing Railway Work	PT Citra Surya Jaya	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,005
13.	FEA & FDGA Process Safety Study	PT Gexcon Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	90,00	0,04
14.	Temporary Facility 4 Pipe Shop	PT Gading Bumi Sentosa	-	PT Rekayasa Industri	90,00	0,02
15.	Batching Plant (Pack-2)	PT Graha Telkomsigma	-	PT Rekayasa Industri	75,00	0,01
16.	Detail Engineering Services	PT Amsecon Berlian Sejahtera	-	PT Rekayasa Industri	90,00	0,02
17.	GPF Concrete Road & Drainage (Pack- 1)	PT Sido Mulyo Bayu Aji	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,12
18.	Temporary Facility Work Package-9	PT Sido Mulyo Bayu Aji	-	PT Rekayasa Industri	90,00	0,02
19.	HVAC Installation Works	PT Tata Udara Nusantara	-	PT JGC Indonesia	30,00	0,15
20.	HVAC Work Supply	PT Catur Mitra Teknologi	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,75
21.	Work Package for ME Building, Mechanical Installation and Electrical	PT Swadaya Graha	-	PT JGC Indonesia	90,00	0,03
22.	Steel Structure Installation	PT Daya Patra Ngasem Raya	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,23





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI <i>INVOICE</i> (%)
23.	Temporary Facility and Laydown Area for HVAC Work	PT Swadaya Graha	-	PT JGC Indonesia	50,00	0,002
24.	Installation and Electrical	PT Swadaya Graha	-	PT JGC Indonesia	90,00	0,01
25.	Perbaikan <i>TF WH</i> <i>RFID Masjid Clinic</i> <i>Office</i>	PT Daya Patra Ngasem Raya	-	PT Rekayasa Industri	85,00	0,01
26.	Fabrication Derrick Flare	PT Citra Gaia	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,06
27.	Improvement Access Erection & Laydown	PT Yasa Industri Nusantara	-	PT Rekayasa Industri	75,00	0,04
28.	Perbaikan <i>Labor</i> <i>Canteen 1 &amp; 2</i>	PT Daya Patra Ngasem Raya	-	PT Rekayasa Industri	65,00	0,01
29.	Temporary Facility Work Package-9C	PT Sido Mulyo Bayu Aji	-	PT Rekayasa Industri	85,00	0,01
30.	General Mechanical Package 1	PT Guna Teguh Abadi	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,48
31.	International Freight	PT Mitra Galperti	-	PT Rekayasa Industri	10,00	0,03
32.	Service Agreement Supervisory for Sales Gas	PT MAN Energy Solutions Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	20,00	0,15
33.	Precom Material Pipe	PT Marselus Global Makmur	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,001
34.	Precom Material Pipe and Plate	PT Sutindo Project Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,007
35.	Operating Procedure Development	PT Berca Engineering International	-	PT Rekayasa Industri	90,00	0,03
36.	Slope Normalization Infrastructure Area	PT Jawa Express Indogas	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,03
37.	Civil & Building IF Area	PT Sido Mulyo Bayu Aji	-	PT JGC Indonesia	90,00	0,01





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI INVOICE (%)
38.	Waterproofing and Epoxy Coating	PT Cipta Mandiri Nusantara Abadi	-	PT JGC Indonesia	40,00	0,006
39.	Injection Water Condensate Pipeline work	PT Daya Patra Ngasem Raya	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,13
40.	Painting Pipe AG Pack-2	PT Meiso Utama Teknik	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,27
41.	Perimeter Fence Pack 2 (Grade Beam)	PT Sido Mulyo Bayu Aji	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,004
42.	Civil Work Pack 1B	PT Gading Bumi Sentosa	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,07
43.	Installation of Steel Structure Package- 4	PT Guna Teguh Abadi	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,12
44.	4 Unit PAC Administration and Office Building	PT Tata Udara Nusantara	-	PT JGC Indonesia	80,00	0,03
45.	AHU & ACU of HVAC	PT Tata Udara Nusantara	-	PT JGC Indonesia	80,00	0,005
46.	DCO & DCI HVAC Package	PT Tata Udara Nusantara	-	PT JGC Indonesia	80,00	0,003
47.	Civil Work Package -2A	PT Anugrah Bumi Nusantara	-	PT Rekayasa Industri	75,00	0,013
48.	Hot Deep Galvanized	PT Citra Gaia	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,02
49.	Civil Work Pack 1C	PT Gading Bumi Sentosa	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,07
50.	Refractory Work	PT Meiso Utama Teknik	-	PT Rekayasa Industri	40,00	0,05
51.	Demineralized Water Supply	PT Metito Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	80,00	0,004
52.	Steel Structure Pack-5	PT Supra Surya Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,13
53.	Civil Work Package 1F	PT Karya Amanah Sinergi	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,09





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI <i>INVOICE</i> (%)
54.	Paint Shop Small Bore & Support	PT Fajar Inayah Teknicoat	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,05
55.	Civil Work Package 2C	PT Parta Sunjaya- Bintang Lima	-	PT Rekayasa Industri	80,00	0,02
56.	Roofing & Siding Supply and Install	PT Alkindo Perkasa	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,14
57.	Supply & Application Chemical Tile	PT Hensun Prima Cipta Abadi	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,05
58.	PWHT Task Force & Massive GPF Area	PT Murni Guna Pratama	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,02
59.	Civil Work Package 2F	PT Anugrah Bumi Nusantara	-	PT Rekayasa Industri	80,00	0,07
60.	Civil Work Package 2H	PT Anugrah Bumi Nusantara	-	PT Rekayasa Industri	80,00	0,06
61.	Shop Fabrication & Field Installation GRVE Piping	PT Citra Yala Tama Raya	-	PT Rekayasa Industri	80,00	0,04
62.	Civil Work 580 & 570 Area	PT Swadaya Cipta	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,23
63.	Field Paint Pip AG Area 2	PT Bumi Agung Perkasa Indah	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,10
64.	Shop Painting Piping Pipe	PT Jaya Multi Usaha	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,03
65.	PWHT Massive Area	PT Global Heateraingdo Teknik	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,01
66.	Piping Field Fab Instll Pack Area 1	PT Kencana Daya Optima	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,11
67.	Penyediaan Manpower dan Equipment/Tools Consumable	Koperasi Reka Sejahtera	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,14
68.	Penyediaan Manpower dan Equipment/Tools Consumable Paint	PT Cahya Mandiri Gemilang	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,16





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI INVOICE (%)
	Construction CT370					
69.	Leak Test Work	PT Hydra Asia Energy	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,12
70.	Painting Piping AG	PT Putra Dumas Lestari	-	PT Rekayasa Industri	55,00	0,10
71.	Temporary Load Bank	PT Anggreko Energy Services Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	80,00	0,02
72.	PWHT Wellpad Area	Koperasi Reka Sejahtera	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,01
73.	Fabrication Platform Cold Room OPW	PT Cahya Mandiri Gemilang	-	PT JGC Indonesia	30,00	0,002
74.	Fencing Work	PT Anugrah Bumi Nusantara	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,05
75.	Supply & Installation Waterproofing Double Protection CT329	Koperasi Reka Sejahtera	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,01
76.	Shop Painting Piping & Pipe Support	PT Azkamedia Teknologi Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,06
77.	Penyediaan  Manpower dan  Equipment/Tools  Consumable Finish  Civil	PT Anugrah Bumi Nusantara	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,01
78.	Finishing Building Work	Koperasi Reka Sejahtera	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,01
79.	Catalyst Loading Work	PT Lasindo Jayabersama	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,03
80.	Repair Services LP Permeate Compr CT392	PT MAN Energy Solutions Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,01
81.	Marking & Lettering Pipe	PT Cahya Mandiri Gemilang	-	PT JGC Indonesia	50,00	0,001





## NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI <i>INVOICE</i> (%)
82.	Supply and Install Safety Sign	PT Recon Sarana Utama	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,03
83.	Field Paint Piping AG	PT Bima Nusapersada Sakti	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,12
84.	Foundation Work	PT Karya Amanah Sinergi	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,04
85.	General Mechanical Package 3	PT Guna Teguh Abadi	-	PT Rekayasa Industri	35,00	0,46
86.	PWHT Task Force GPF	PT Murni Guna Pratama	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,01
87.	Supply Install Comm Bio Septictank	PT Bima Reksa	-	PT Rekayasa Industri	30,00	0,01
88.	Penyediaan Manpower, Tools Material, Gen. Civil CT395	PT Anugrah Bumi Nusantara	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,14
89.	Road and U-Ditch Interconnecting IF Area	PT Sido Mulyo Bayu Aji	-	PT JGC Indonesia	30,00	0,02
90.	General Civil, Concrete Structure, Building & Piping Work	PT Swadaya Graha	-	PT JGC Indonesia	70,00	0,01
91.	Pre-Start Up Safety Review	PT Gexcon Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,01
92.	GPF EDG Installation Work CT412	PT Guna Teguh Abadi	-	PT Rekayasa Industri	50,00	0,01
93.	MPS For Electrical Work	PT Semen Indonesia Logistik	-	PT Rekayasa Industri	70,00	0,02
94.	MPS Scaffolding Mass Construction	PT Sido Mulyo Bayu Aji	-	PT Rekayasa Industri	80,00	0,124
95.	MPS for Commissioning	PT Tracon Industri	-	PT Rekayasa Industri	90,00	0,13
96.	Jasa Perbaikan Filter Modif Panel	PT Energy Management Indonesia	-	PT Rekayasa Industri	80,00	0,002





### NO. KONTRAK 4650000076 GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

No. #61 / Rev: 00

Periode Data: 23 Maret 2018 - 31 Mei 2023

NO.	DESKRIPSI	SUBKONTRAKTOR/ VENDOR	NOMOR INVOICE	DIKELUARKAN OLEH	TKDN ESTIMASI (%)*	NILAI <i>INVOICE</i> (%)
97.	Asphalt Work for ROW & Metering	PT Kejora	-	PT Rekayasa Industri	60,00	0,06
98.	Asphalt Work for GPF	PT Jawa Ekpress Indogas	-	PT Rekayasa Industri	45,00	0,04
99.	E & I Installation Work Pack 2	PT Recon Sarana Utama	-	PT Rekayasa Industri	40,00	0,001
	TOTAL					11,13

#### Keterangan:

Hasil Kontribusi dari TKDN Estimasi adalah 4,20%

#### IX. RENCANA AKTIVITAS PERIODE SELANJUTNYA

- Melanjutkan proses verifikasi dan monitoring aktivitas serta mengumpulkan dokumen pendukung.
- Menindaklanjuti poin-poin pada Sasaran Perhatian.

### X. LAMPIRAN

- 1. Komitmen TKDN Konsorsium RJJ
- 2. Kurva-S TKDN Lengkap
- 3. Surat Persetujuan Monitoring TKDN

<sup>\* =</sup> Nilai TKDN tersebut hanya merupakan estimasi. Untuk nilai TKDN final didapatkan setelah selesai dilakukan verifikasi terhadap vendor/subkontraktor



# Lampiran 1. Komitmen TKDN Konsorsium RJJ



4.2.3

**Domestic Content** 

### PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JASA PEMBORONGAN DOMESTIC CONTENT CALCULATION - PROJECT

Formulir No : SC - 12B Form No: SC - 12B

### Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama	: Qomaruzzaman	Takashi Isayama	Nurdin Haris
- Jabatan	: Direktur	Proposal Manager	President Director
- Bertindak untuk dan atas nama	: PT Rekayasa Industri	JGC Corporation	PT JGC Indonesia
- Alamat	Jl. Kalibata Timur I No.36 Kalibata, Jakarta 12740, Indonesia	2-3-1 Minato Mirai Nishi-ku, Yokohama 220-6001, Japan	JI. T.B. Simatupang 7-B, Jakarta, Indonesia
- Telepon	: +62-21-798-8700	+81-45-682-8912	+62-21-2997-6504
- Faksimili	: +62-21-794-9319	+81-45-682-8939	+62-21-2997-6599
– Email	: qomaruzzaman@rekayasa.co.id	Isayama.takashi@jgc.com	Nurdin.haris@jgc- indonesia.com
- Status Perusahaan	: Perusahaan Dalam Negeri	Perusahaan Asing	Perusahaan Nasional
- Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa	: Diutamakan	Non APDN	Diberdayakan

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender:

S14LL2020 No. Tender

Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) Judul Tender

Jasa Pemborongan Engineering Procurement Construction Installation (EPCI) Darat Jenis Komoditas Jasa

Consortium









### **Domestic Content**

Target Capaian TKDN Jasa

50 %

Batasan minimal TKDN

40 %

Di Kontraktor KKS

PT Pertamina EP Cepu

dengan pengutamaan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

Komitmen TKDN

40.03 %

Komitmen Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Dalam Negeri

70.00 %

Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia

80.00 %

Berikut adalah table rincian komponen biaya penawaran kami:

	KOMPONEN	MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
а	b	С	d	е
а	Komponen Biaya Barang & Jasa :			
	1 Barang	USD	501,439,291.04	32.08%
	2 Jasa	USD	399,945,546.71	50.00%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	901,384,837.75	40.03%
b.	Komponen non-Biaya	USD	82,441,307.25	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	983,826,145.00	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK 007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.







**Domestic Content** 

Jakarta, 26 Juli 2016

### PT Rekayasa Industri



Qomaruzzaman Name:

Direktur Title

### **JGC Corporation**



Name : Takashi Isayama

: Project Manager

### PT JGC Indonesia




Name: Nurdin Haris

: President Director



# Lampiran 2. Kurva-S TKDN Lengkap

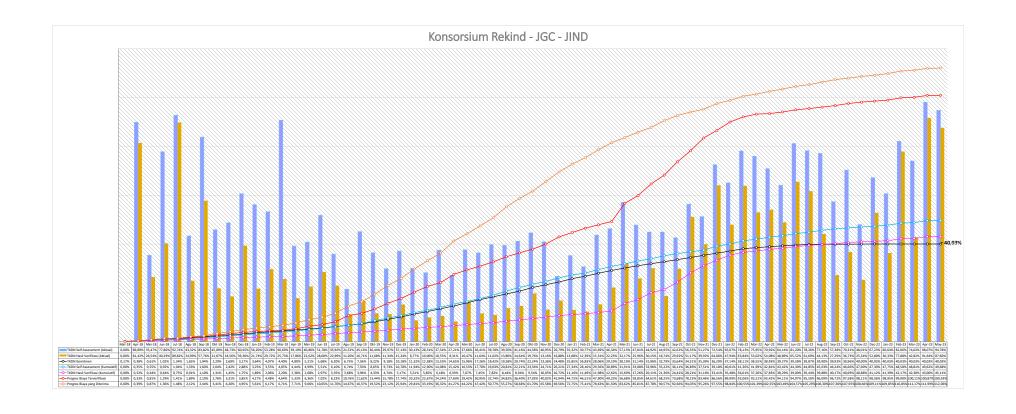

# Lampiran 3. Surat Persetujuan Monitoring TKDN

### PERSETUJUAN HASIL MONITORING TKDN - BULANAN

ACKNOWLEDGMENT OF TKDN MONITORING RESULT - MONTHLY

Pengguna Barang/Jasa

User of Goods/Services

: PT. PERTAMINA EP CEPU

Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. REKAYASA INDUSTRI

Vendor of Goods/Services

<u>Alamat</u> : JL. Kalibata Timur 1 No.36, Kalibata, Jakarta 12740

Address

**NPWP** : 01.000.494.3-051.000

Tax Number

: 4650000076 Nomor Kontrak

Contract Number

Judul Kontrak : GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE Contract Title JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

: 1 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023 (Monitoring 61) Waktu Monitoring

Time Period

Biaya Yang Diverifikasi : US\$ 547.446,83

Verified Cost

: 87,47% Nilai TKDN

**TKDN Value** (Delapan Puluh Tujuh Koma Empat Tujuh Persen)

Referensi : 1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013

Reference 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011

> 3. SK DIRJEN MIGAS Nomor 181.K/10/DJM.S/2014 4. Pedoman Tata Kerja Nomor 007/SKKO0000/2015/S0

Disetujui Oleh: Acknowledged by:

PT. REKAYASA INDUSTRI

ntent Specialist

Diverifikasi Oleh: Verified by:



### PERSETUJUAN HASIL MONITORING TKDN - BULANAN

ACKNOWLEDGMENT OF TKDN MONITORING RESULT - MONTHLY

Pengguna Barang/Jasa

User of Goods/Services

: PT. PERTAMINA EP CEPU

Nama Penyedia Barang/Jasa

Vendor of Goods/Services

: PT. JGC INDONESIA

Alamat

: JL. T.B. Simatupang 7-B, RT.01 RW.02, Cilandak Barat, Cilandak,

Address

Jakarta Selatan

**NPWP** 

: 01.000.219.4-058.000

Tax Number

Nomor Kontrak

: 4650000076

Contract Number

Judul Kontrak

Contract Title

: GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD (JTB UNITIZATION GAS PROJECT)

Waktu Monitoring

Time Period

: 1 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023 (Monitoring 61)

Biaya Yang Diverifikasi

Verified Cost

: US\$ 10.587,90

Nilai TKDN

: 94,35%

**TKDN Value** 

(Sembilan Puluh Empat Koma Tiga Lima Persen)

Referensi

Reference

: 1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011

3. SK DIRJEN MIGAS Nomor 181.K/10/DJM.S/2014

4. Pedoman Tata Kerja Nomor 007/SKKO0000/2015/S0

Disetujui Oleh: Acknowledged by:

RT. JGC INDONESIA

Diverifikasi Oleh: Verified by:

PT. SUCOFINDO



Senior Assessor

**RUDY ARMANSYAH** 

Project Administration Senior Staff
